LBWP Sewer Project Survey Schedule
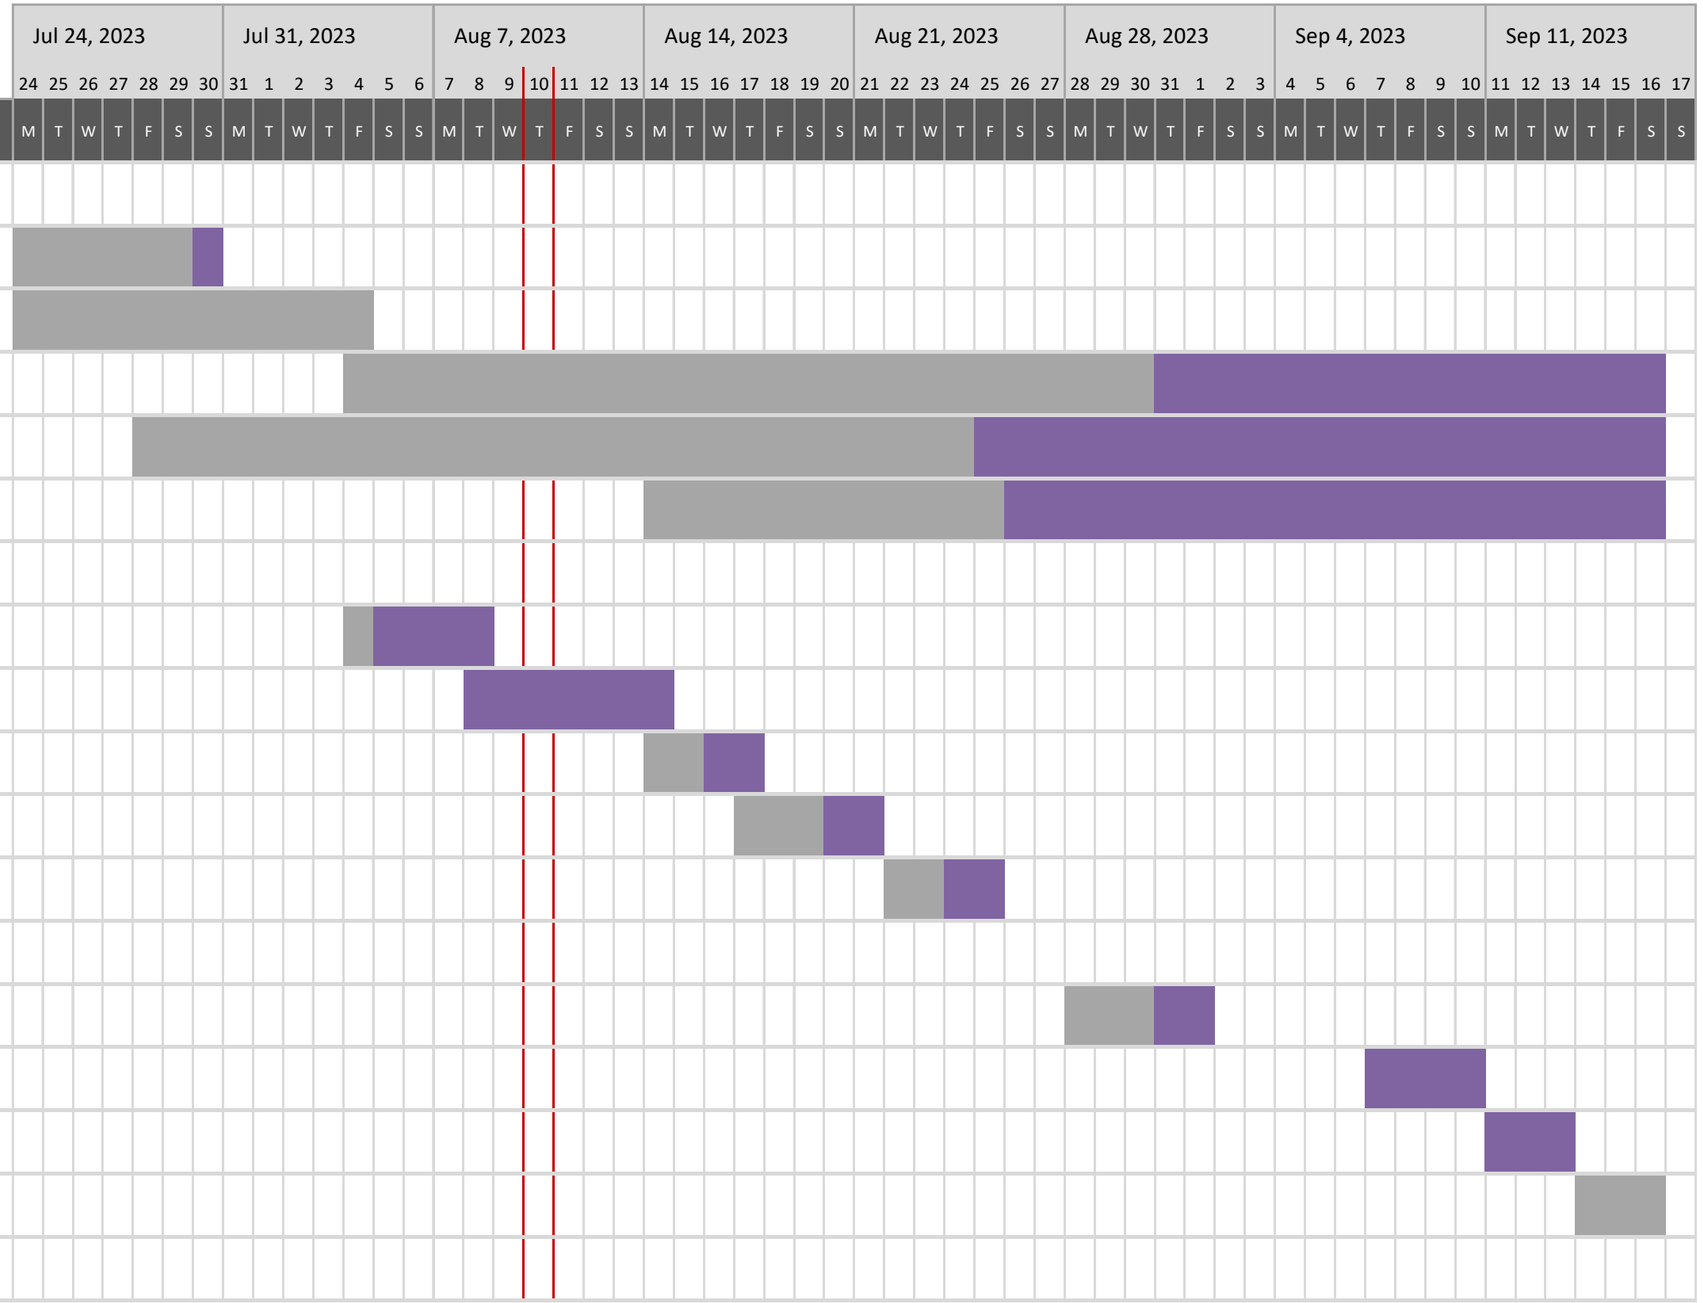
TASK	PROGRESS	START	END
Land Surveying			
Records Research	96%	7/7/23	7/30/23
Survey Control	100%	7/24/23	8/4/23
Field Survey	55%	8/4/23	9/22/23
Calculations	50%	7/28/23	9/22/23
Drafting	30%	8/14/23	9/22/23
Surveying Area's			
NH 16 / 302	25%	8/4/23	8/8/23
Intervale	0%	8/8/23	8/14/23
Meadowwood	60%	8/14/23	8/17/23
Birchlea	60%	8/17/23	8/21/23
Fox Run	60%	8/22/23	8/25/23
Surveying Area's			
Woodland Pines	60%	8/28/23	9/1/23
Nuthatch	0%	9/7/23	9/10/23
East Branch	0%	9/11/23	9/13/23
Farm NEI	60%	9/14/23	9/18/23
NH 16 A	0%	9/18/23	9/22/23
